


Kurzdokumentation Maßnahme



Dresden.
DIE STADT

Gewässerunterhaltungsmaßnahme Gewässer II. Ordnung GH_I-86-00006.01 - Maltengraben

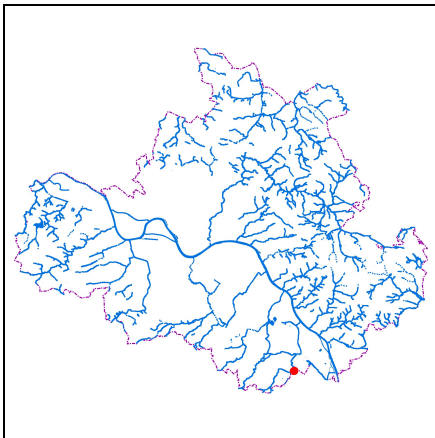

Lage in Dresden



Lageplan Maßnahme,
Maßstab 1:10.000



Abb. 1: Fertiggestellte Rampe, 16.03.2021

Maßnahme	Maltengraben: Gewässerhochlagenrückbau zwischen B172 und Lugaer Straße (Herstellung Unterhaltungsweg)
	Herstellung der fußläufigen Durchgängigkeit des vorhandenen, i.B. der Fuß- und Radwegbrücke B 167 Heidenauer Straße im Bestand jedoch beidseitig unterbrochenen, Unterhaltungsweges für die Gewässerunterhaltung am Maltengraben
Bauherr	Landeshauptstadt Dresden
Maßnahmetyp	Unterhaltung / Pflege / Beräumung
Gesamtkosten (brutto)	46.500 EUR
Realisierung	09/2020 bis 03/2021
Gemarkung	Großluga
Stadtbezirk	Prohlis
Ort/Lage	Link zum Gewässersteckbrief: https://stadtplan.dresden.de/getimage/image.ashx?w=500&idasset=1393412&k=10CAA7B2E8EB4782505D7977768E2EED

Betroffene Gewässer

Gewässer	Abschnitte
Maltengraben	00-20-03/24 bis 00-20-03/27
Gebietskennzahl	5371929299

Hydrologische Kenngrößen im Bereich der Maßnahme

Station (Gewässerabschnitt, Lage)	Abfluss in m³/s bei				
	MQ	HQ ₁	HQ ₁₀	HQ ₂₀	HQ ₁₀₀
00-20-03/1 Mündung in den Lockwitzbach	0.02	-	-	-	4.00
00-20-03/11 unterhalb Bahn	0.02	-	-	-	3.50
00-20-03/26 unterhalb Einmündung Großlugaer Graben	0.01	-	-	-	3.30

Situation vor der Maßnahme

- keine fußläufige Durchgängigkeit des Unterhaltungsweges vorhanden



Abb. 2: Errichtung Rampen - Bau, 28.09.2020

■ Maßnahmebeschreibung

- Herstellung einer beidseitigen Anrampung an der in Dammlage verlaufenden Heidenauer Straße

■ Wirkung der Maßnahme

- Herstellung eines durchgängigen Unterhaltungsweges für die Gewässerunterhaltung
- Verbesserung der Erlebbarkeit des renaturierten Maltengraben in Großluga



Abb. 3: Fertiggestellte Rampe, 16.03.2021
